



รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 12 เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	2
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	7
3.1 การติดตาม	7
3.2 การประเมินผล	37
ส่วนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	38

ส่วนที่ 1

บทนำ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นสิ่งเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงผลสำเร็จในการดำเนินงานว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และผลลัพธ์ที่ได้สามารถตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ตรงประเด็น หรือไม่รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนทุกคนพึงตระหนัก และให้ความสำคัญเพื่อวัตถุประสงค์ความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนปีงบประมาณ และนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น นำไปใช้ประกอบการพัฒนาการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการดำเนินงานให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ยังกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้กำกับการใช้ งบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ ประชาชนและท้องถิ่น ดังนั้น การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรได้รับการ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริงหรือไม่ รวมถึงเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ เหมาะสมหรือพิจารณายุติการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีส่วนงานนโยบายและแผนทำหน้าที่รวบรวม และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ดังนั้นการติดตามจึงเป็นกิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง หากค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม(Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน การติดตามจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ การติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามผลย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล(Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ


ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)


ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์

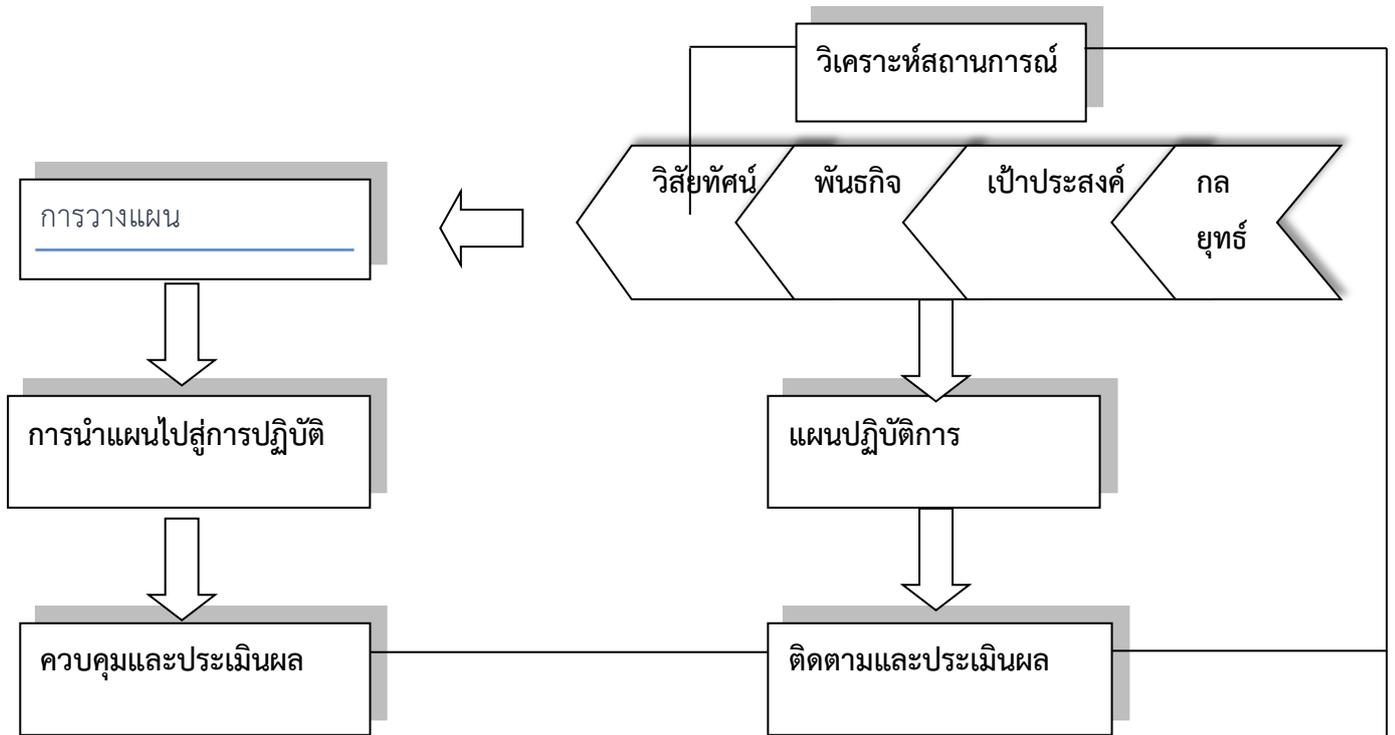

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

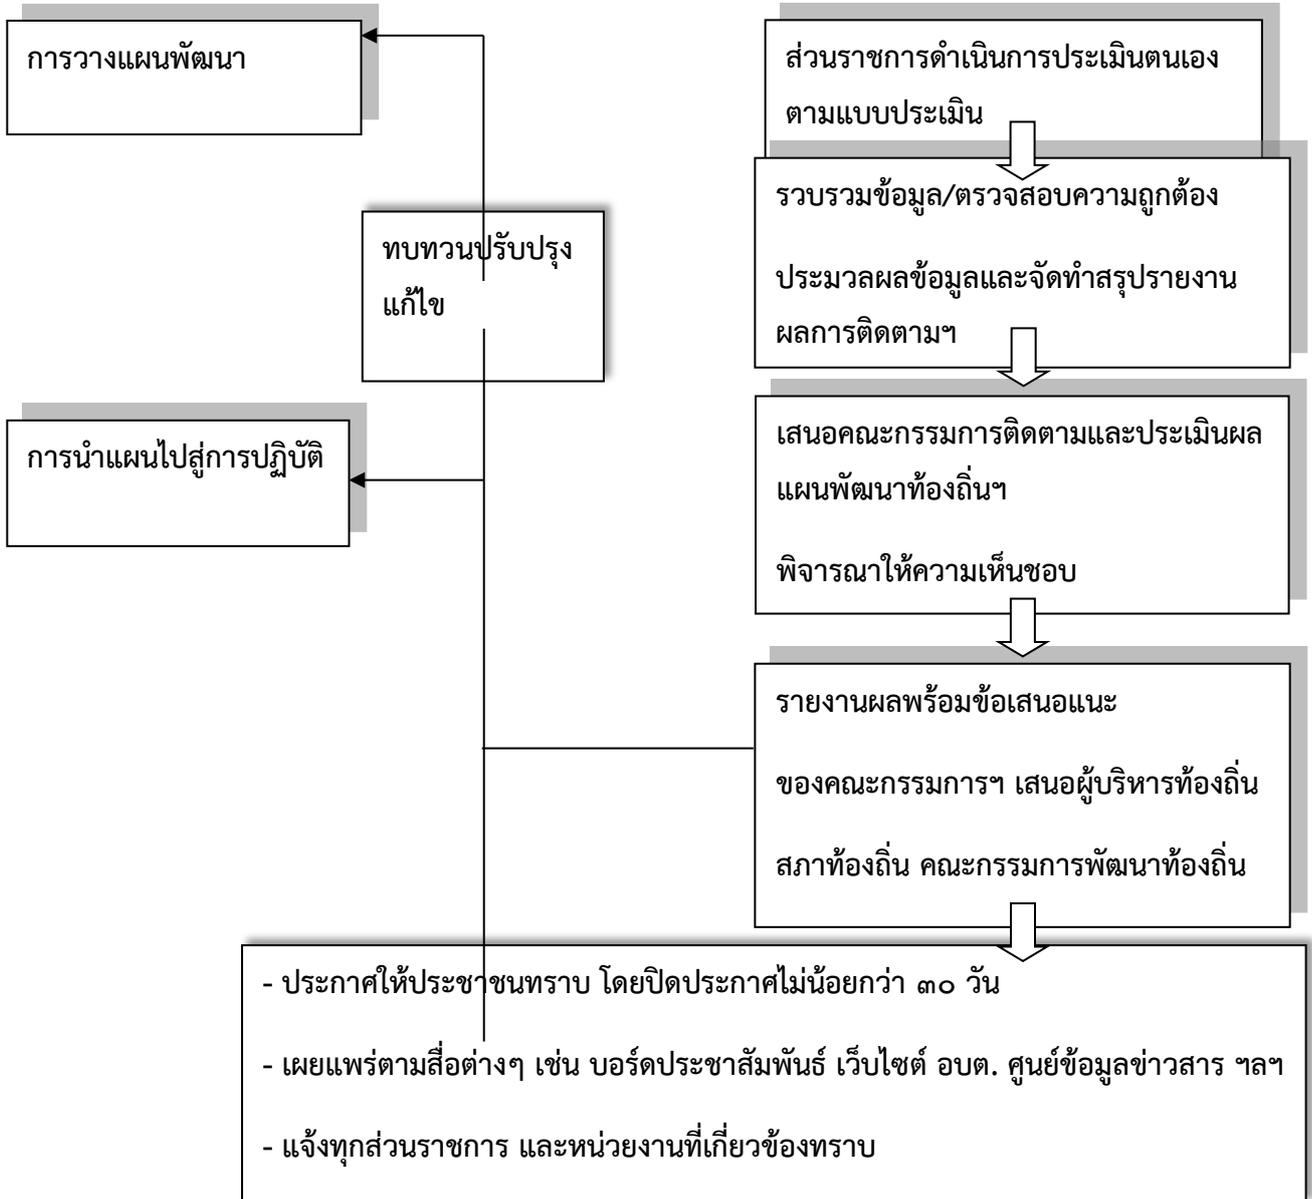

วิธีการติดตามและประเมินผล

1. การติดตาม เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2565 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามการดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ติดตามการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง ดังนี้

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน รายงานภายในเดือนเมษายน 2565

ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565) รอบ 12 เดือน รายงานภายในเดือนธันวาคม 2565

2. การประเมินผล เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านทางคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาละสองครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ 3

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

3.1 การติดตาม ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565)

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปี 2565 ไว้ จำนวน 305 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 161,639,073.-บาท โครงการที่นำบรรจุเข้าข้อบัญญัติจำนวน 70 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 22,277,325.-บาท


การกำกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	


จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(บาท)
1)ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่	148	105,974,000.-	148	105,974,000.-	190	131,721,000.-	229	145,679,000.-	217	140,637,000.-
2)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	52	15,114,000.-	52	15,114,000.-	52	15,114,000.-	58	15,359,000.-	58	15,359,000.-
3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	21	5,313,073.-	21	5,313,073.-	22	5,333,073.-	22	5,333,073.-	22	5,333,073.-
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการเกษตร	7	405,000.-	7	405,000.-	8	410,000.-	8	410,000.-	8	410,000.-
รวม	228	126,806,073.-	228	126,806,073.-	272	152,578,073.-	317	166,781,073.-	305	161,739,073.-

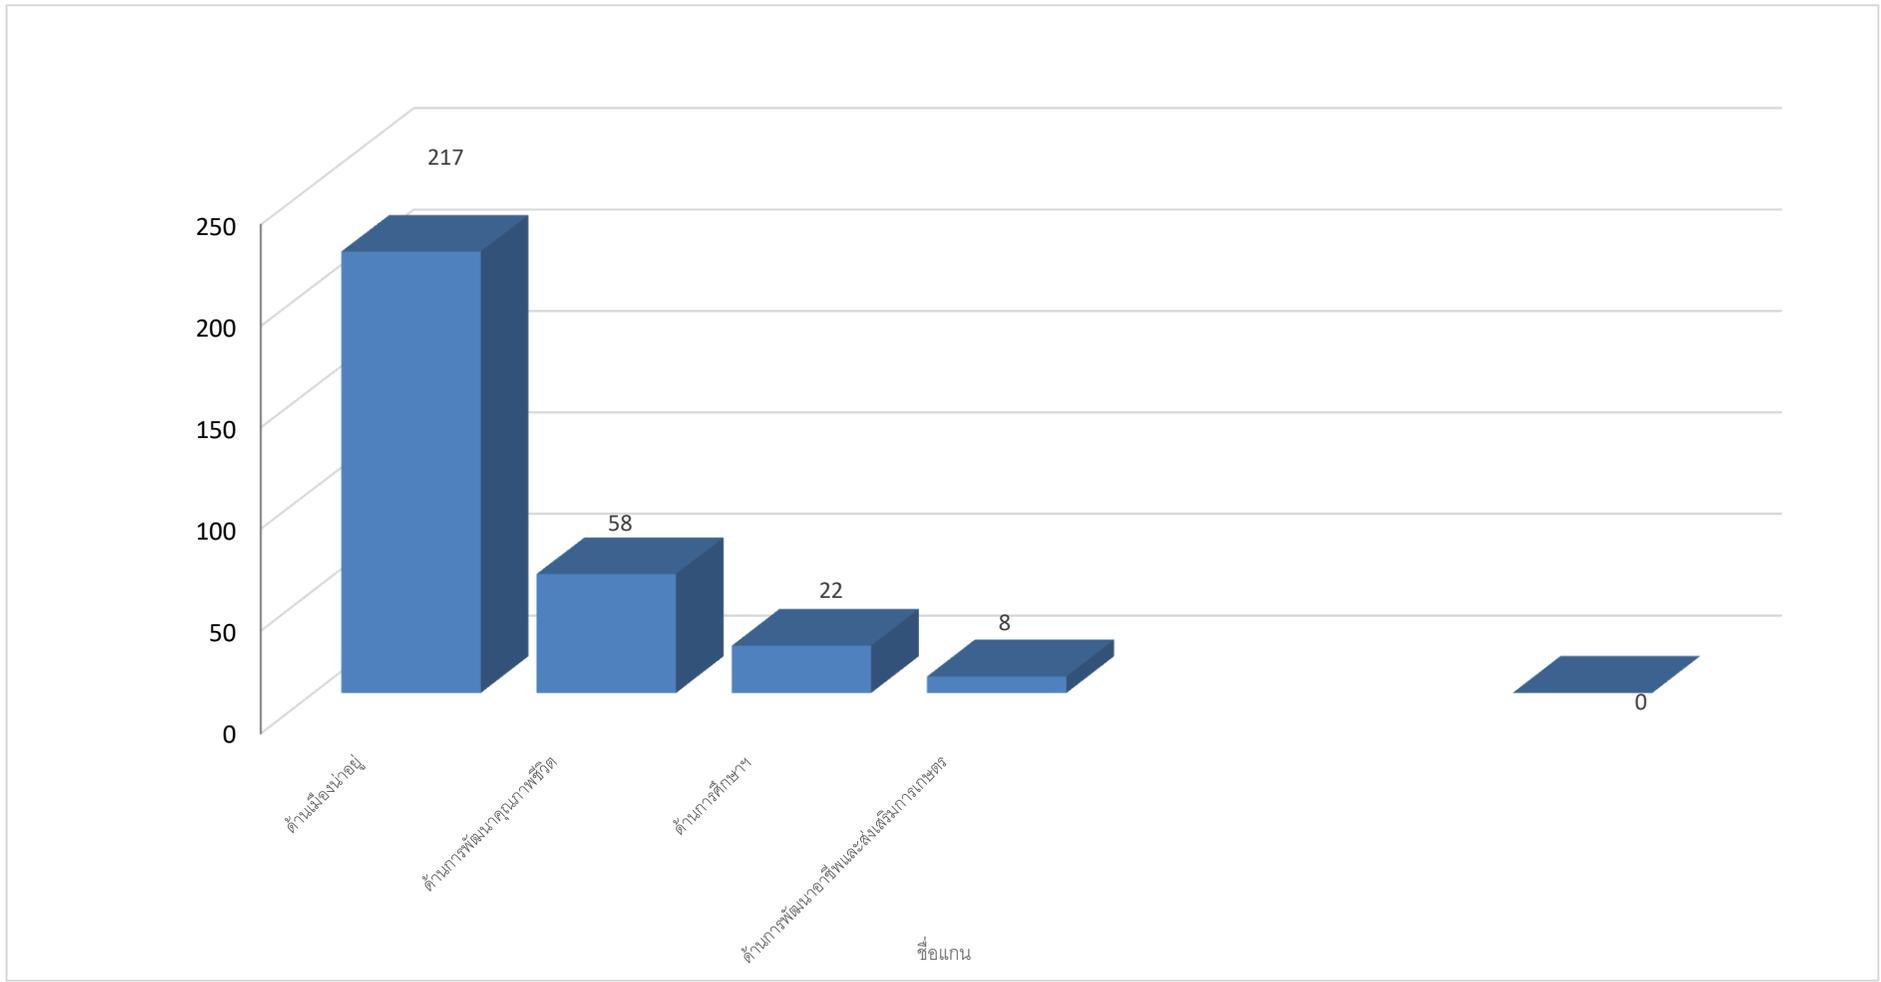

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

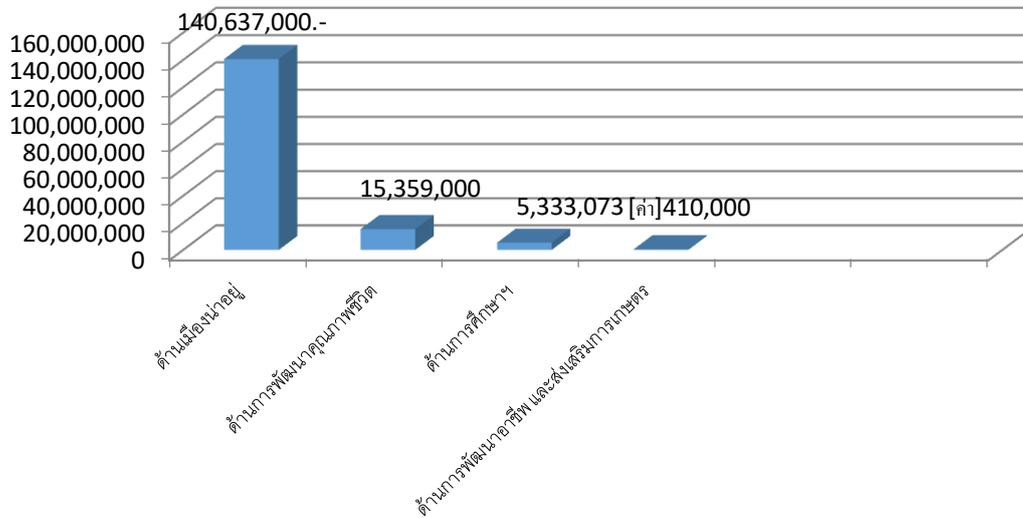

การติดตาม ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565)

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	โครงการที่ ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่							
1	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	6	780,000.-	4	594,670.-	สำนักปลัด กองคลัง	หน้า 15
2	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	5	150,100.-	4	115,384.-	สำนักปลัด	หน้า 16
3	แผนงาน สาธารณสุข	1	10,000.-	1	10,000.-	สำนักปลัด	หน้า 17
4	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	1	100,000.-	1	100,000.-	กองช่าง	หน้า 17
5	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	27	4,200,000.-	21	2,926,214.22	กองช่าง	หน้า 18-31
รวม		40	5,240,100.-	31	3,746,268.22		คิดเป็น ร้อยละ 80.00

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	โครงการที่ ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี							
1	แผนงาน สาธารณสุข (สำนักปลัด)	3	690,000.-	3	611,144.-	สำนักปลัด	หน้า 32
2	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	3	90,000.-	1	10,000.-	กอง สวัสดิการ สังคม	หน้า 32
3	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	4	234,450.-	3	203,250.-	กอง สวัสดิการ สังคม	หน้า 33
4	แผนงานงบ กลาง	3	12,733,400.-	3	5,957,600.-	กอง สวัสดิการ สังคม	หน้า 33
	รวม	13	13,747,850.-	10	6,781,994.-		คิดเป็น ร้อยละ 76.92

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	โครงการที่ ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น							
1	แผนงาน การศึกษา	5	2,789,375.-	4	2,624,725.-	กอง การศึกษา	หน้า 34
2	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	9	450,000.-	-	-	กอง การศึกษา	หน้า 35
	รวม	14	3,239,375.-	4	2,624,725.-		คิดเป็น ร้อยละ 28.57

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	โครงการที่ ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร							
1	แผนงาน การเกษตร	3	50,000.-	2	22,815.-	สำนักปลัด	หน้า 36
	รวม	3	50,000.-	2	22,815.-		คิดเป็น ร้อยละ 66.67
	รวมทั้งสิ้น	70	22,277,325.-	47	13,175,802.22		คิดเป็น ร้อยละ 67.14

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	550,000.- โอนเพิ่ม 115,000.-	524,688.-	140,312.-	สำนักปลัด -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	2. โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น	10,000.-	-	10,000.-	สำนักปลัด -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	3. โครงการทัศนศึกษาดูงาน	20,000.-	-	20,000.-	สำนักปลัด -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	4. โครงการประชุมประชาคมจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000.-	4,982.-	15,018.-	สำนักปลัด -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	5. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.-	45,000.-	-	สำนักปลัด -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	6. อุดหนุนโครงการรัฐพิธี	20,000.-	20,000.-	-	สำนักปลัด -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	รวม 6 โครงการ	780,000.-	594,670.-	185,330.-		2		4	

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (รณรงค์ ลด ละ เลิกยาเสพติดทุกชนิด)	20,100.-	18,800.-	1,300.-	สำนักปลัด -แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	2. อดทนุหนุที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	30,000.-	30,000.-	-	สำนักปลัด -แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	3. โครงการ 7 วันปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ	60,000.-	57,084.-	2,916.-	สำนักปลัด -แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	4. โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.โคกสูง	30,000.-	-	30,000.-	สำนักปลัด -แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	5. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	10,000.-	9,500.-	500.-	สำนักปลัด -แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	รวม 5 โครงการ	150,100.-	115,384.-	34,716.-		1		4	

1.3 แผนงานสาธารณสุข

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการอบรมการคัดแยกขยะภายในครอบครัว	10,000.-	8,450.-	1,150.-	สำนักปลัด -แผนงานสาธารณสุข	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	รวม 1 โครงการ	10,000.-	8,450.-	1,150.-		-	-	1	

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองแปนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 วังทอง คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน ทางเดิน-วิ่ง คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ 100 ตารางเมตร รั้ว คสล. สำเร็จรูปยาว 40 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 7 ข้อ 26 (กองช่าง)	100,000.-	100,000.-	-	กองช่าง -แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	รวม 1 โครงการ	100,000.-	100,000.-	-		-	-	1	

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 สายทางที่ 1 จุดเริ่มต้น บ้านนายจรงค์ ยี่มผู้ จุดสิ้นสุด บ้านนายสุนทร ชัยษา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 3 ข้อ 10 (กองช่าง)	190,000.-	189,000.-	1,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 สายทางที่ 2 (ต่อจากของเดิมบ้านนายบุญรอด ปัตถานะ) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสามารถ ทองหล่อ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายชาติ เทียงอวน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้า 1 ข้อ 2 (กองช่าง)	310,000.-	-	310,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	1	-	-อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 สายทางที่ 1 (ต่อจากของเดิมถนนทางหลวงชนบท 4019) จุดเริ่มต้น สระน้ำวัดโคกสูง จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางบ้านโคกสูง – บ้านสะเดาหวาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 73 เมตร หานา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 3 ข้อ 10 (กองช่าง)	184,000.-	183,000.-	1,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 สายทางที่ 2 (ต่อจากของเดิมจากหนองตาปู่) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายวัฒนา สิ้นสุพรรณ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสุวรรณ สิ้นสุพรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หานา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 54 ข้อ 96 (กองช่าง)	200,000.-	199,000.-	1,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 สายทางที่ 1 (ต่อจากของเดิมสี่แยกศาลากลางหมู่บ้าน) จุดเริ่มต้น บ้านนายพลพงษ์สุระ จุดสิ้นสุด บ้านนายณรงค์ โสตรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ลงลูกรังใหญ่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ข้อ 62 (กองช่าง)	111,000.-	110,000.-	1,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 สายทางที่ 2 จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางบ้านโนนสมบูรณ์ – บ้านหนองเต็ง จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อถนนคอนกรีตบริเวณสวนยางนายชูศรี พันสมบัติ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 44 ตารางเมตร ลงลูกรังใหญ่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 6 ข้อ 24 (กองช่าง)	24,000.-	24,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้น บ้านนายสำราญ ทองภูบาล จุดสิ้นสุด บ้านนายไพศาล มงคลการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 4 ข้อ 14 (กองช่าง)	250,000.-	250,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 (ต่อจากของเดิมบ้านนางต๋น สุนทะวงษ์) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายปิ่น หินภู จุดสิ้นสุด โรงเรียนบ้านสระตะเคียน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้า 11 ข้อ 37 (กองช่าง)	500,000.-	-	500,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	1	-	-อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาทวาน หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้น บ้านนายปัญญา จันทร์สวด จุดสิ้นสุด บ้านนายนิวัติ พุ่มสระเกตุ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ย ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 56 ข้อ 108 (กองช่าง)	296,000.-	295,000.-	1,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 1 สายทางที่ 1 (ต่อจากของเดิมที่ดินนายธีรชัย มารศรี) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสุดใจ สอนไธสง จุดสิ้นสุด ที่ดินนายประหยัด สอนไธสง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ข้อ 79 (กองช่าง)	180,000.-	180,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 1 สายทางที่ 2 จุดเริ่มต้น ถนนทางหลวงชนบท 4019 จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสมหมาย ศรีปาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 8 ข้อ 30 (กองช่าง)	150,000.-	149,000.-	1,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	12. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 (ต่อจากของเดิมได้หนองใหญ่) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายทองศรี บุตรวิชา จุดสิ้นสุด ที่ดินนางหนูเงิน ปะวะเค ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 54 ข้อ 101 (กองช่าง)	185,000.-	-	185,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	1	-	-อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	13. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้น ถนนทางหลวงชนบท 4019 จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสุดที่ ประทุมพา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 435 เมตร หน้า 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 195.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น อยู่ในเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 หน้า 4 ข้อ 14 (กองช่าง)	80,000.-	80,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	14. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (ต่อจากของเดิม เส้นบ้านโนนสวรรค์ - บ้านโนนสำราญ ต.ห้วยหิน อ.หนอง หงส์) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายพร สิงขพา จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสม จิตร สินสุพรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 783 เมตร หน้า 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 469.8 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ข้อ 48 (กอง ช่าง)	200,000.-	200,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	15. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านหนองหัว หมูที่ 6 จุดเริ่มต้น วัด บ้านหนองหัว จุดสิ้นสุด ที่ดินนายประมวล พานดวงแก้ว ขนาดมากอาจจะกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จัดเป็น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบด อัดแน่น อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 หน้า 10 ข้อ 36 (กองช่าง)	37,000.-	37,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	16. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นถนนทางหลวงชนบท 4019 จุดสิ้นสุด บ้านนาย มนูญ โคลนกระโทก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.04 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 6 ข้อ 23 (กองช่าง)	95,000.-	95,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	17. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 จุดสิ้นสุด บ้านนางทัศนีย์ เดชสายบัว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 ข้อ 72 (กองช่าง)	475,000.-	475,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	18. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้น คั่นคลองถนน บ้านโนนสมบูรณ์ - ต.คลองเมือง อ.จักราช จุดสิ้นสุด ที่ดินนาย เพ็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37 ข้อ 30 (กองช่าง)	247,000.-	-	247,000.-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	1	-	-อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	19. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้น ถนนทางหลวง เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 207 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้า 4 ข้อ 12 (กองช่าง)	85,000.-	85,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	20. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 สายทางที่ 1 จุดเริ่มต้น บ้านสะเดาหวาน จุดสิ้นสุด ที่ดินนาย สุบิน โพธิ์ศาลา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 8 ข้อ 28 (กองช่าง)	148,000.-	148,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	21. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 สายทางที่ 2 จุดเริ่ม ต้น ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2166 จุดสิ้นสุด ที่ดินนายถวิล สุตชา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 243 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2563 หน้า 8 ข้อ 29 (กองช่าง)	100,000.-	100,000.-	-	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 สายทางที่ 3 จุดเริ่ม ต้น บ้านนางชำนานญ ดุมกลาง จุดสิ้นสุด บ้านนายบัวลอย ฐลาไธสง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 138 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2554 หน้า 5 ข้อ 18 (กองช่าง)	56,000.-	56,000.-	-	กองช่าง -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	23. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองหัว หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้น ที่ดินนายศิริ พาน ดวงแก้ว จุดสิ้นสุด บ้านนางงลักษณ์ นิมิตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็น ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 72 ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดเกลี่ยบดอัดแน่น อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 7 ข้อ 28 (กองช่าง)	29,000.-	26,214.22.-	2,785.78.-	-แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	24. โครงการวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีตลาด หน้าท่อบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 วางท่อ คสล.พร้อมเท คอนกรีตลาดหน้าท่อบ้านคู ขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ วาง ท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ะละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ จุดที่ 1 บริเวณที่นายทศพล ทศภักดิ์ จุดที่ 2 บริเวณที่นายบุญผล ปะวะเค ตามแบบที่ อบต.กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 53 ข้อ 94 (กองช่าง)	30,000.-	30,000.-	-	กองช่าง -แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	25. โครงการวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีตลาด หน้าท่อบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 (บริเวณป่าช้าบ้านโคกสูง) วางท่อคสล.พร้อมเทคอนกรีตลาดหน้าท่อบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณป่าช้าบ้านโคกสูง (ทางทิศเหนือ)วางท่อสล ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้า 1 ข้อ 4 (กองช่าง)	15,000.-	15,000.-	-	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	26. โครงการวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีตลาด หน้าท่อบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 (บริเวณสระวัดบ้านโคกสูง) สระวัดบ้านโคกสูง วางท่อ ลล ขนาด 1 เมตร จำนวน 4 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 13,000-บาท อยู่ในเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2560 หน้า 1 ข้อ 4 (กองช่าง)	13,000.-	-	13,000.-	กองช่าง -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	1	-	-อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	27. โครงการวางท่อคสล.พร้อมเทคอนกรีตลาด หน้าท่อบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 (บริเวณสะพานองหัวช้าง) บริเวณสะพานองหัวช้าง (ทางทิศตะวันตก) วางท่อคสล.ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 4 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตลาดหน้าจำนวน10,000 บาท ท่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด คิดเป็นเงินงบประมาณ 10,000 บาท ดาบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในเพิ่มเติมในพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-25653 ครั้ง 1/2564 หน้า 2 ข้อ 5 (กองช่าง)	10,000.-	-	10,000.-	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	1	-	-อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ
	รวม 27 โครงการ	4,200,000.-	2,926,214.22	18,785.78		-	6	21	

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.1 แผนงานสาธารณสุข

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	5,000.-	432.-	4,568.-	สำนักปลัด	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	2. โครงการพ่นหมอก ควัน/หยอดสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก	43,000.-	30,202	12,798.-	สำนักปลัด	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	3. โครงการปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ภัย อบต.โคกสูง	642,000.-	580,510.-	61,490	สำนักปลัด	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	รวม 3 โครงการ	690,000.-	611,144.-	78,856		-	-	3	

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่	30,000.-	-	30,000.-	กองสวัสดิการ	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	2. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000.-	10,000.-	-	กองสวัสดิการ	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	3. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000.-	-	50,000.-	กองสวัสดิการ	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	รวม 3 โครงการ	90,000.-	10,000.-	80,000.-		2	-	1	

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการเยาวชนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	30,000.-	29,700.-	300.-	กองสวัสดิการ	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลโคกสูง	50,000.- โอนเพิ่ม 64,450.-	113,550.-	50,000.-	กองสวัสดิการ	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	3. โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์	30,000.-	-	30,000.-	กองสวัสดิการ	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	4. โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	60,000.-	60,000.-	-		-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	รวม 4 โครงการ	234,450.-	203,250.-	80,300.-		1	-	3	

2.4 แผนงานงบกลาง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,912,600.-	8,452,500.-	460,100.-	กองสวัสดิการ	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,772,800.-	3,472,400.-	300,400.-	กองสวัสดิการ	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.- โอนเพิ่ม(22,000.-)	61,500.-	8,500.-	กองสวัสดิการ	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	รวม 3 โครงการ	12,733,400.-	5,957,600.-	769,000.-		-	-	3	

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการพัฒนาบุคลากรทางศึกษา	30,000.-	-	30,000.-	กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	837,375.-	770,660.-	66,715.-	กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	3. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประถมศึกษาและเด็กก่อนเกณฑ์	1,722,000.-	1,654,065.-	67,935.-	กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	4. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนโคกสูง	50,000.-	50,000.-	-	กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	5. อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อเรียนรู้บุคลากรและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกสูง	150,000.-	150,000.-	-	กองการศึกษา -แผนงานการศึกษา	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	รวม 5 โครงการ	2,789,375.-	2,624,725.-	164,650.-		1	-	4	

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์	200,000.-	-	200,000.-	กองการศึกษา	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	2. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด)	10,000.-	-	10,000.-	กองการศึกษา	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	3. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000.-	-	50,000.-	กองการศึกษา	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000.-	-	60,000.-	กองการศึกษา	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	5. โครงการประเพณีบุญพระเวส	10,000.-	-	10,000.-	กองการศึกษา	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	6. โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	50,000.-	-	50,000.-	กองการศึกษา	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	7. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.-	-	10,000.-	กองการศึกษา	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	8. โครงการประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่	50,000.-	-	50,000.-	กองการศึกษา	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	9. โครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000.-	-	10,000.-	กองการศึกษา	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	รวม 9 โครงการ	450,000.-	-	450,000.-		9	-	-	

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร

4.1 แผนงานการเกษตร

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
	1. โครงการส่งเสริมการบำรุงดินแบบเกษตรอินทรีย์	10,000.-	-	10,000.-	สำนักปลัด	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
	2. โครงการส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน	15,000.-	9,835.-	5,165.-	สำนักปลัด	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	3. โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. (งานปลูกพืชพยากรท้องถิ่น)	25,000.-	12,980.-	12,020.-	สำนักปลัด	-	-	1	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	รวม 3 โครงการ	50,000.-	22,815.-	27,185.-		1	-	2	

3.2 การประเมินผล

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) รอบ 12 เดือน

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตามแผนดำเนินงาน จำนวน 70 โครงการ

รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ 12 เดือน) จำนวน 70 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 32.86

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 0

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 41 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 67.41

ส่วนที่ 4

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสูง ไม่สามารถดำเนินการ ได้ 23 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงาน ของผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงและเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 งบประมาณงบบรรณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ร้อยละ 64.80 ของ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้เสนอต่อสภาองค์การส่วนตำบลในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วนั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายตามประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนี ปักโคลาพัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
