



รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 12 เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	2
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	12
3.1 การติดตาม	12
3.2 การประเมินผล	52
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา	53

ส่วนที่ 1

บทนำ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นสิ่งเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงผลสำเร็จในการดำเนินงานว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และผลลัพธ์ที่ได้สามารถตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ตรงประเด็น หรือไม่รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนทุกคนพึงตระหนัก และให้ความสำคัญเพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนงบประมาณ และนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น นำไปใช้ประกอบการพัฒนาการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการดำเนินงาน ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ยังกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้กำกับการใช้ งบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และท้องถิ่น ดังนั้น การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรได้รับการติดตามและ ประเมินผลเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรือไม่ รวมถึงเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมหรือ พิจารณายุติการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีส่วนงานนโยบายและแผนทำหน้าที่รวบรวม และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ดังนั้นการติดตามจึงเป็นกิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง หากค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม(Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน การติดตามจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ การติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามผลย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล(Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการ

ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)


ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์



จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

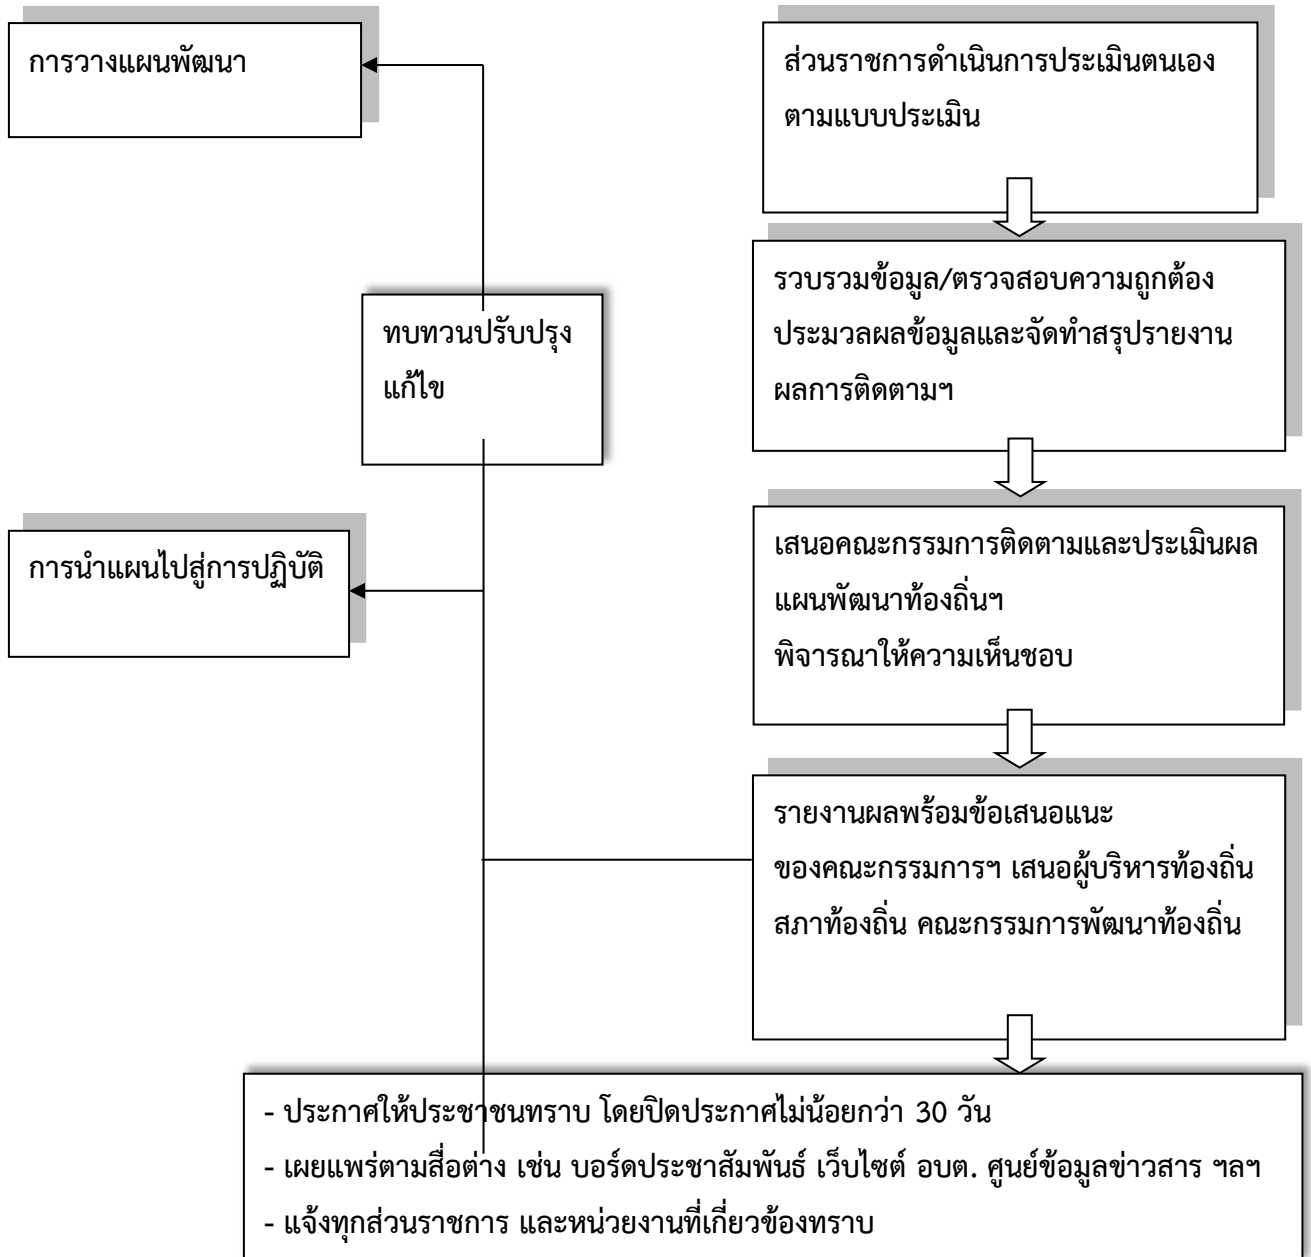

วิธีการติดตามและประเมินผล

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2567 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาตามความสำเร็จในดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการสำหรับโครงการที่เป็นโครงการจัดอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆต่อไป

2.2 การประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงต่อไป

3. แบบรายงานการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา

3.1 แบบที่ 1 การประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแบบที่ 1 เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตนเองได้ทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

3.2 แบบที่ 2 แบบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

3.3 แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยแบบ 3/2 และแบบ 3/3 เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

4. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

-ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

-ระดับองค์กร สำนักปลัด งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจึงนำข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

2. การติดตามประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) รอบ 6 เดือน

ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) รอบ 12 เดือน

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่การสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-กันยายน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง


2.รายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1)ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่	156	69,346,000	146	41,030,000	136	32,860,500	98	26,249,000	85	24,570,500
2)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	78	17,987,000	78	17,987,000	78	17,987,000	78	17,987,000	78	17,987,000
3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	22	5,540,000	22	5,540,000	22	5,540,000	22	5,540,000	22	5,540,000
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร	15	4,305,000	15	4,305,000	15	4,305,000	15	4,305,000	15	4,305,000
5รวม	271	97,178,000	261	68,862,000	251	60,692,500	213	54,081,000	200	52,402,500

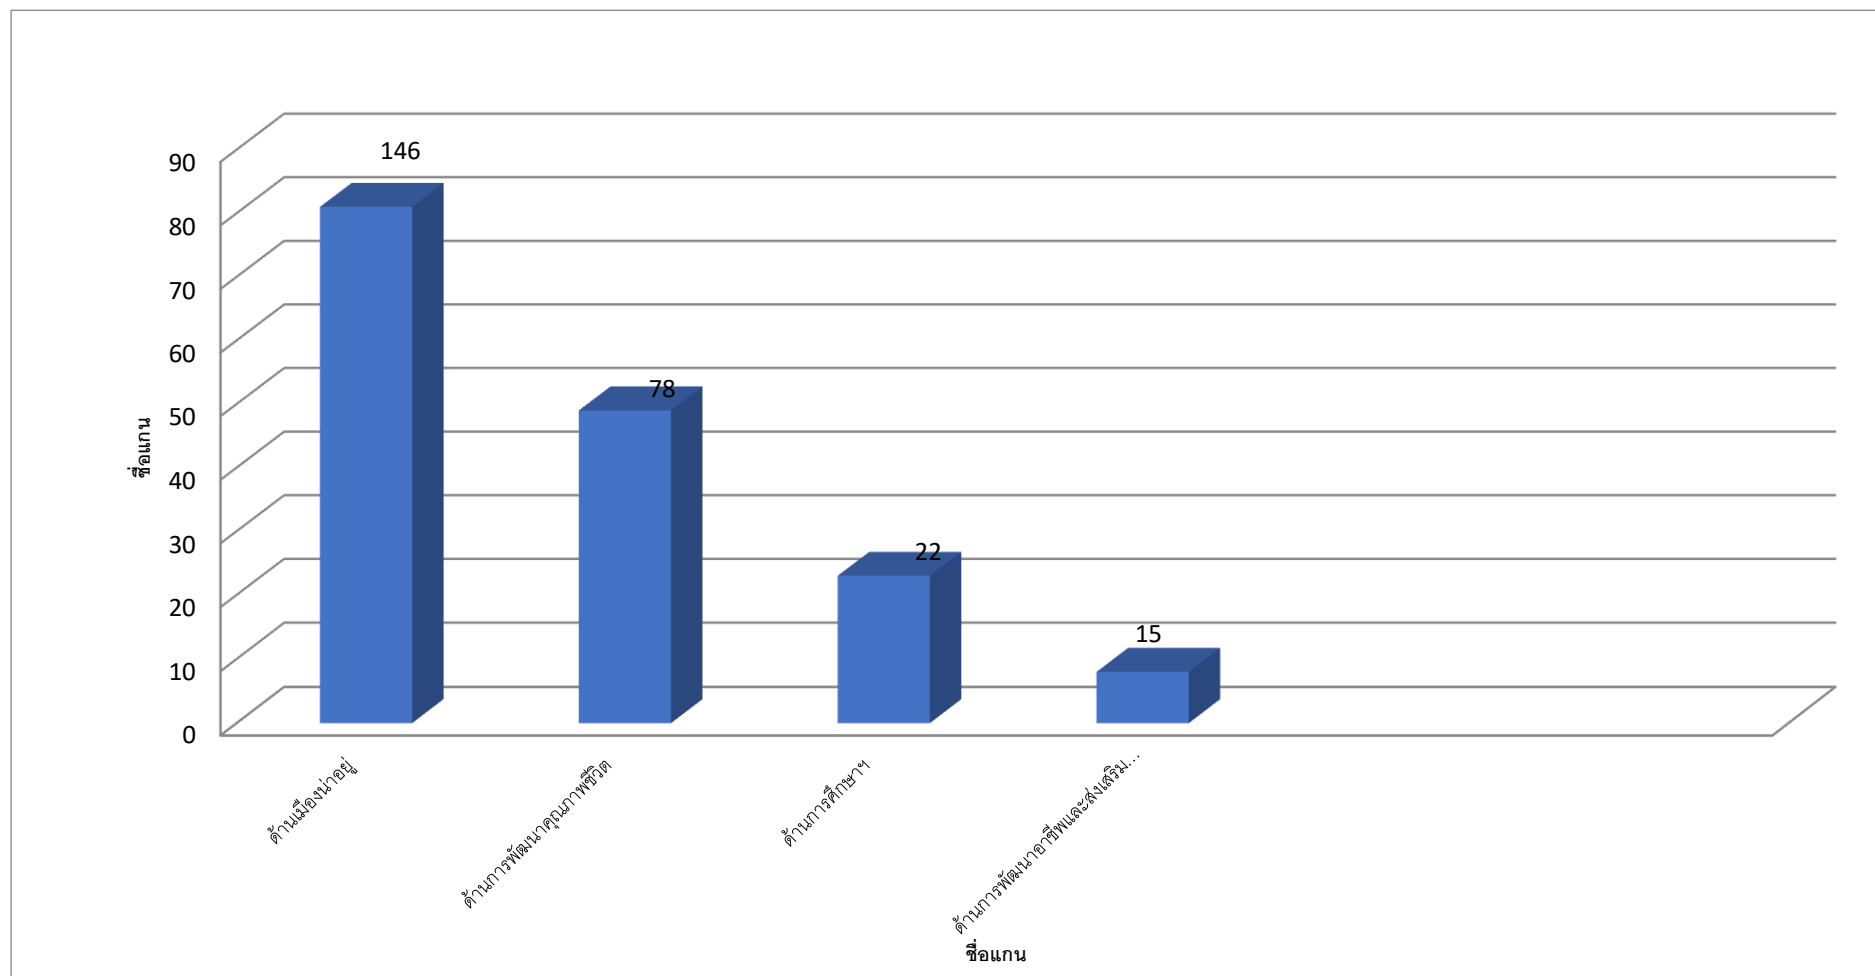

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

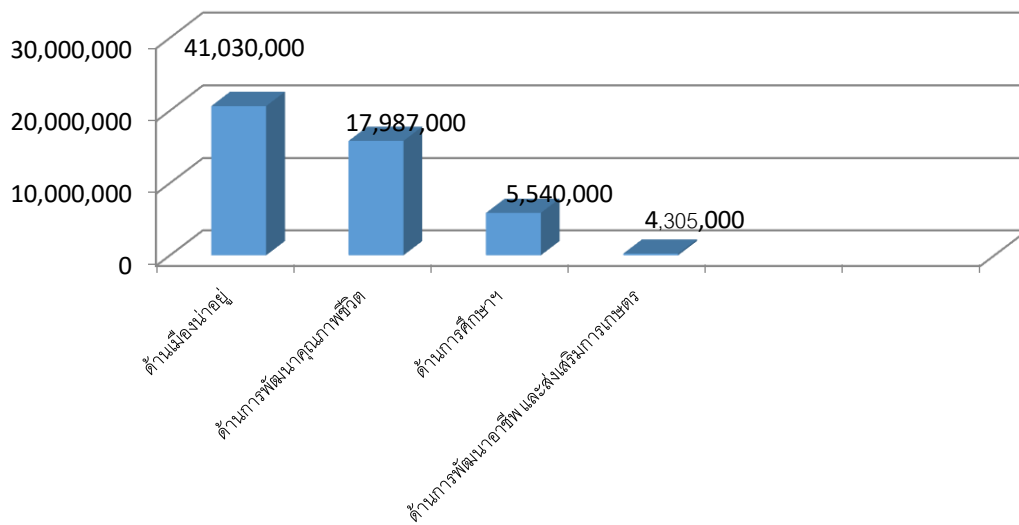

ส่วนที่ 3

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

3.1 การติดตาม ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566- กันยายน 2567)

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปี 2567 ไว้ จำนวน 261 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 68,887,000.- บาท โครงการที่นำบรรจุเข้าข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 66 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 23,600,130.- บาท เงินนอกงบประมาณ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 10,055,000.- บาท เงินนอกงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม) จำนวน 19 โครงการ เป็นเงิน 4,368,000.- บาท

การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1)ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่	156	69,346,000	146	41,030,000	136	32,860,500	98	26,249,000	85	24,570,500
2)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	78	17,987,000	78	17,987,000	78	17,987,000	78	17,987,000	78	17,987,000
3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	22	5,540,000	22	5,540,000	22	5,540,000	22	5,540,000	22	5,540,000
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการเกษตร	15	4,305,000	15	4,305,000	15	4,305,000	15	4,305,000	15	4,305,000
รวม	271	97,178,000	261	68,862,000	251	60,692,500	213	54,081,000	200	52,402,500

การติดตาม ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566– กันยายน 2567)

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอนองก่ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	แผนงาน	โครงการตามข้อบัญญัติ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โครงการที่ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่							
1	แผนงานเคหะและชุมชน	6	487,800	6	448,367.05	กองช่าง	
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25	4,668,000	22	3,698,000	กองช่าง	
รวม 2 แผนงาน		31	5,155,800	28	4,146,367.05		

ลำดับที่	แผนงาน	โครงการตามข้อบัญญัติ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โครงการที่ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี							
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	65,000	2	65,000	สำนักปลัด	
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	90,000	2	42,340	สำนักปลัด	
3	แผนงานสาธารณสุข	1	10,000	1	9,700	สำนักปลัด	
4	แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	40,000	2	40,000	กองสวัสดิการและสังคม	
5	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	451,850	8	432,770	กองสวัสดิการและสังคม	
6	แผนงานงบกลาง	3	13,537,200	3	13,070,200	กองสวัสดิการและสังคม	
รวม 6 แผนงาน		20	14,194,050	18	13,660,010		

ลำดับที่	แผนงาน	โครงการตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	โครงการที่ ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น							
1	แผนงานการศึกษา	5	3,178,950	5	2,882,783	กองการศึกษาฯ	
2	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	7	590,000	5	503,900	กองการศึกษาฯ	
รวม 2 แผนงาน		12	3,768,950	10	3,386,683		

ลำดับที่	แผนงาน	โครงการ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โครงการที่ ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร							
1	แผนงานการเกษตร	3	56,500	3	44,836	สำนักปลัด	
รวม 1 แผนงาน		3	56,500	3	44,836		
รวมทั้งสิ้น 11 แผนงาน		66	23,175,300	59	21,237,896.05		

เงินนอกงบประมาณ(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	แผนงาน	โครงการตามข้อบัญญัติ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โครงการที่ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมื่อนำอยู่							
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	10,055,000	-	-	กองช่าง	เงินนอกงบประมาณ
รวม 1 แผนงาน		2	10,055,000	-	-		

เงินนอกงบประมาณ(งบจ่ายขาดเงินสะสม) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	แผนงาน	โครงการตามข้อบัญญัติ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โครงการที่ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์ด้านเมื่อนำอยู่							
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19	4,368,000	10	921,000	กองช่าง	เงินนอกงบประมาณ
รวม 1 แผนงาน		19	4,368,000	10	921,000		

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
1	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> 1.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 -เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จากลานกีฬา หมู่ที่ 2 ถึงป่าช้าจีน ความยาวรวม 120 เมตร อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 56 ข้อ 6	48,300.-	48,296.59.-	√	-	-	6 ส.ค. 67	25 ส.ค. 67	กองช่าง	
	2.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 -เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 จากที่ดินนายสุดที่ ประทุมผา ถึงที่ดินนายสุดที่ ประทุมผา ความยาวรวม 160 เมตร อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 57 ข้อ 10	97,500.-	97,458.81.-	√	-	-	6 ส.ค. 67	25 ส.ค. 67	กองช่าง	
	3.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 -เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 จากหน้าวัด ถึงที่ดินนายอุดมศักดิ์ คำภา ความยาวรวม 440 เมตร อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 62 ข้อ 31	162,800.-	162,793.01.-	√	-	-	6 ส.ค. 67	25 ส.ค. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u> 4.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 -เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 จากที่ดินนายถวิล สุดชา ถึงที่ดินนายถวิล สุดชา ความยาวรวม 80 เมตร -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 60 ข้อ 20	36,000.-	35,923.01.-	√	-	-	6 ส.ค. 67	25 ส.ค. 67	กองช่าง	
	5.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 -เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 จากที่ดินนายสุดใจ สอนโธสง ถึงที่ดินนางบุญเรือง เรืองกล้า ความยาวรวม 200 เมตร -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 55 ข้อ 3	78,000.-	38,723.-	√	-	-	6 ส.ค. 67	25 ส.ค. 67	กองช่าง	
	6.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 จากที่ดินนายใส ทศมาศ ถึงที่ดินนางสุนทรา เขี่ยมมโน ความยาวรวม 180 เมตร -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 62 ข้อ 30	65,200.-	65,172.63.-	√	-	-	6 ส.ค. 67	25 ส.ค. 67	กองช่าง	
	รวม 6 โครงการ	487,800.-	448,367.05.-							

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
2	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 1.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคุขาด) -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง (โคกสูงคุขาด) ผนังกระจกอลูมิเนียมภายในขนาดยาว 10.50 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่ 31.50 ตารางเมตร ผนังตาข่ายถักภายนอก พื้นที่ 30 ตารางเมตร ผนังปูกระเบื้องผิวหยาบภายนอก พื้นที่ 80 ตารางเมตร -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 85 ข้อ 36	200,000.-	200,000.-	√	-	-	10 ก.ย.67	9 พ.ย. 67	กองช่าง	
	2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคุขาด หมู่ที่ 2 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคุขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนางทองพูน คลังอาวุธ จุดสิ้นสุด ที่ดินนางทองม้วน โกฎแก้ว ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 113 ข้อ 139	457,000.-	452,000.-	√	-	-	29 พ.ค. 67	27 ส.ค. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนิน การ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 (สายที่ 1)-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายทางที่ 1)จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสุวรรณ์ สินสุพรรณ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายพอน ตัปโธสง ขนาดผิวดินกว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางกว้าง ข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยละ 100 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 92 ข้อ 62	180,000.-	-	-	√	-	9 ก.ย. 67	-	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน 167,000.-
	4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 (สายที่ 2) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายทางที่ 2) จุดเริ่มต้นที่บ้านนางต๋มทอง สุขเกษม จุดสิ้นสุด ที่บ้านนายขาว สินสุพรรณ ขนาดผิวดินกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 111 ข้อ 132	163,000.-	162,500.-	√	-	-	29 พ.ค.67	27 ส.ค.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นที่บ้านนายไพศาล มงคลการ จุดสิ้นสุด ที่บ้านนางรุจิรา นาวราศิริ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขแผนครั้งที่ 1/2566 หน้า 114 ข้อ 143	476,000.-	-	-	√	-	9 ก.ย. 67	-	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน 441,000.-
	6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิมที่ดินนายผัด บัวไข) จุดเริ่มต้น ทิศเหนือสระหนองบุญนา จุดสิ้นสุด ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2166 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 595 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 89 ข้อ 49	359,000.-	355,000.-	√	-	-	8 ก.พ. 67	1 เม.ย. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสมหมาย ศรีปาน จุดสิ้นสุด เมรุบ้านหนองนกเขา ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 510 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 123 ข้อ 177	300,000.-	298,000.-	√	-	-	29 พ.ค.67	11 ก.ค.67	กองช่าง	
	8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 (สายที่ 1) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 (สายที่ 1) จุดเริ่มต้น ที่ดินนางสาวเพชร มุลมีศรี จุดสิ้นสุด ที่ดินนายพรมลื หอมวัน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 118 ข้อ 159	134,000.-	132,000.-	√	-	-	29 พ.ค.67	10 ก.ค.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 (สายที่ 2) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 (สายที่ 2) (ต่อจากของเดิมจากสามแยกสะพานองไผ่) จุดเริ่มต้น สะพานองไผ่ จุดสิ้นสุด วัดอรุณโพธิราษฎร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบรอยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผนครั้งที่ 1/2566 หน้า 87 ข้อ 42	269,000.-	-	-	√	-	-	8 ธ.ค. 67	กองช่าง	ก่อสร้าง ก่อสร้างผูกพัน 250,000.-
	10.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของเดิมที่นายเจริญศักดิ์ สมเสนาะ) จุดเริ่มต้น ที่นายนายประมวล พานดวงแก้ว จุดสิ้นสุด ที่นายนายพล นามหล้า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตรหนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 180 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 122 ข้อ 175	100,000.-	100,000.-	√		-	2 เม.ย. 67	3 พ.ค. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 11.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นที่ดินนางสาวมันทนา ตาสว่าง จุดสิ้นสุด ที่ดินนายไพฑูรย์ วานสูงเนิน ขนาด กว้าง 3.5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร ลูกรัง 157.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 112 ข้อ 137	70,000.-	66,500.-	√	-	-	13 ก.พ.67	14 มี.ค.67	กองช่าง	
	12.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบล โคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นคลองอีสานเขียว จุดสิ้นสุดสามแยกหนองผือบริเวณที่ดินนายอุดมศักดิ์ คำภา ขนาด กว้าง 3.5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 472.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 98 ข้อ 86	190,000.-	190,000.-	√	-	-	10 ก.ย.67	11 พ.ย.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 13.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองก๊ก จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนางชำนาญ ดุมกลาง จุดสิ้นสุด คลองอีสานเขียว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 240 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 114 ข้อ 145	104,000.-	104,000.-	√	-	-	10 ก.ย.67	9 ธ.ค.67	กองช่าง	
	14.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองก๊ก จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นประปาบ้านหนองหว้า จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดิน นางทัศนีย์ เดชสายบัว กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตรหนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 222ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 91 ข้อ 57	100,000.-	97,500.-	√	-	-	13 ก.พ.67	13 พ.ค.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 15.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคันคูคลอง บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังคันคูคลองบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (คันคูคลองทางทิศ ตะวันตก) จุดเริ่มต้น ที่ดินนางสาวมันทะนา ตาสว่าง จุดสิ้นสุด ที่ดินนางสาวมันทะนา ตาสว่าง ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 199.50 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น - อยู่ในแผนพัฒนาท้อง ถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข แผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 112 ข้อ 136	100,000.-	95,500.-	√	-	-	13 ก.พ.67	14 มี.ค.67	กองช่าง	
	16.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคันคูคลอง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังคันคูคลอง บ้านสระ ตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (คัน คูคลองทางด้านทิศเหนือ) จุดเริ่มต้น บริเวณที่ดินนายดี พรมน้ำ จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายประกาย อินนา ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 294 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข แผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 121 ข้อ 169	114,000.-	114,000.-	√	-	-	10 ก.ย.67	15 พ.ย.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 17.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายทางที่ 1 จุดเริ่มต้น บริเวณถนนลาดยาง 4020 จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินนางหัน ศรีคุณ ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 700 เมตร หน้า 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก 367.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 117 ข้อ 154	265,000.-	264,000.-	√	-	-	10 ก.ย.67	12 พ.ย.67	กองช่าง	
	18.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 (สายที่ 2)-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายทางที่ 2) (ต่อ จากของเดิมจากบริเวณฝายน้ำล้นที่นายสง่า)จุดเริ่มต้น บริเวณ ที่ดินนางสำเนียง ศรีจุมพลมา จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินนางบุญร่วม หาญเทพ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หน้า 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก 225 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 117 ข้อ 153	162,000.-	162,000.-	√	-	-	10 ก.ย.67	12 พ.ย.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 19.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นที่ดินนายยม พรหมน้ำ จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินนายอุดมศักดิ์ คำภา ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร ลูกรัง 396 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 120 ข้อ 167	168,000.-	163,000.-	√	-	-	13 ก.พ.67	14 มี.ค.67	กองช่าง	
	20.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของเดิมสาย จากถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายแก่น เครือพิมาย จุดสิ้นสุด ที่ดินนายถวิล สุดชา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 390 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 97 ข้อ 83	169,000.-	165,500.-	√	-	-	7 ธ.ค. 66	25 ธ.ค.67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 21.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคันคูคลองอีสานเขียว บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังคันคูคลองอีสานเขียว บ้าน หนองนกเขา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (คันคูคลองอีสานเขียวทางฝั่งทิศใต้) จุดเริ่มต้นถนนลาดยางหมายเลข 4019 จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินนายนิรันดร์ อัมมรณงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 360 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขแผนครั้งที่ 1/2566 หน้า 99 ข้อ 91	136,000.-	131,500.-	√	-	-	7 ธ.ค. 66	25 ธ.ค.67	กองช่าง	
	22.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้นบริเวณ ที่ดินฟาร์มนางสมร ชุมนวน จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนาย ประสาน ชิตทอง ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 525 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย -อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 94 ข้อ 70	207,000.-	203,000.-	√	-	-	2 เม.ย. 67	3 พ.ค. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 23.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สายที่ 1)-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบล โคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (สายที่ 1) (ต่อจากของเดิม จากสระน้ำคึกฤทธิ์) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายแสง โพธิ์ไต้ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายแสง โพธิ์ไต้ ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 500 เมตรหนา 0.15 เมตรปริมาตรลูกรัง 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย-อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 102 ข้อ 101	128,000.-	125,000.-	√	-	-	2 เม.ย. 67	3 ก.ค. 67	กองช่าง	
	24.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สายที่ 2)-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 (สาย ที่ 2) ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อจากของ เดิม ช่วงที่ 2 จากที่ดินนายสวัสดิ์ ช่างเหล็ก) จุดเริ่มต้น ที่ดินนางปิ่น เพี้ยกโว่ จุดสิ้นสุด ที่ดินนางบุญ ศรีวะโสภา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 234 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น-อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 1/2566 หน้า 91 ข้อ 60	100,000.-	100,000.-	√	-	-	23 ก.ย.67	15 พ.ย.67	กองช่าง	
	25.โครงการวางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตลาดหน้าท่อบ้านคูขาด หมู่ที่2-อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - 2570) แก้ไขแผน ครั้งที่ 2/2566 หน้า 91 ข้อ 60	17,000.-	17,000.-	√	-	-	5 ส.ค.67	21 ส.ค.67	กองช่าง	
	รวม 25 โครงการ	4,668,000.-	3,698,000.-							

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.1 แนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> 1.อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.-	45,000.-	√	-	-	22 ธ.ค.66	25 ธ.ค.66	สำนักปลัด	
	2.อุดหนุนโครงการรัฐพิธี	20,000.-	20,000.-	√	-	-	4 ม.ค.67	19 ม.ค.67	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	65,000.-	65,000.-							

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> 1.โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) แห่งชาติ	10,000.-	-	-	-	√			สำนักปลัด	
	2.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	30,000.-	12,340.-	√	-	-	22 มี.ค.67	22 มี.ค.67	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	40,000.-	12,340.-							

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.4 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
2	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u> 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.-	-	-	-	√			สำนักปลัด	
	2.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	30,000.-	30,000.-	√	-	-	25 ก.ค.67	25 ส.ค.67	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	50,000.-	30,000.-							

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.6 แนวทางการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
3	<u>แผนงานสาธารณสุข</u> 1.โครงการอบรมการคัดแยกขยะภายใน ครอบครัว	10,000.-	9,700.-	√	-	-	20 ก.ย.67	20 ก.ย.67	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	10,000.-	9,700.-							

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.7 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
2	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u> 1.โครงการอุดหนุนกึ่งกาชาดอำเภอหนองกี่	30,000.-	30,000.-	√	-	-	25 เม.ย.67	4 ส.ค. 67	กอง สวัสดิการ สังคม	
	2.โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000.-	10,000.-	√	-	-	12 มี.ค.67	29 ก.ค. 67	กอง สวัสดิการ สังคม	
	รวม 2 โครงการ	40,000.-	40,000.-							

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.7 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> 1.โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	87,570.-	79,890.-	√	-	-	25 ก.ย. 67	25 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลโคกสูง	130,000.-	129,370.-	√	-	-	4 ก.ย. 67	6 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	3.โครงการเยาวชนต้นแบบ คุณธรรม จริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	29,400.-	19,435.-	√	-	-	13 ก.ย. 67	13 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	4.โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์	19,800.-	19,050.-	√	-	-	5 มิ.ย. 67	5 มิ.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	5.โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีตำบลโคกสูง	29,130.-	29,075.-	√	-	-	8 ก.ค. 67	9 ก.ค. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	6.โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	10,950.-	10,950.-	√	-	-	1 เม.ย. 67	1 เม.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	7.โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	55,000.-	55,000.-	√	-	-	10 เม.ย. 67	10 เม.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	8.โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	90,000.-	90,000.-	√	-	-	5 ก.ค. 67	30 ก.ค. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม 8 โครงการ	451,850.-	432,770.-							

2.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

2.7 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
4	<u>แผนงานงบกลาง</u>									
	1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,829,200.-	9,416,900.-	√	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	2.เบี้ยยังชีพความพิการ	3,624,000.-	3,585,800.-	√	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.-	67,500.-	√	-	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม 3 โครงการ	13,537,200.-	13,070,200.-							

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

3.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
3	<u>แผนงานการศึกษา</u>									
	1.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	80,000.-	79,590.-	√	-	-	26 มิ.ย.67	28 มิ.ย.67	กองการศึกษาฯ	
	2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	924,350.-	722,466.-	√	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
	3.โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ประถมศึกษาและเด็กก่อนเกณฑ์	1,974,600.-	1,880,727.-	√	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
	4.อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนโคกสูง	50,000.-	50,000.-	√	-	-	22 ส.ค.67	24 ส.ค.67	กองการศึกษาฯ	
	5.อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อ การเรียนรู้บุคลากร และ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลโคกสูง	150,000.-	150,000.-	√	-	-	11 มี.ค.67	12 ก.ค.67	กองการศึกษาฯ	
	รวม 5 โครงการ	3,178,950.-	2,882,783.-							

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

3.2 แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดึงดูดใจของท้องถิ่น

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
8	<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ</u>									
	1.โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์	280,000.-	280,000.-	√	-	-	11 ต.ค.66	18 ต.ค.66	กองการศึกษาฯ	
	2.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง(โคกสูงคูขาด)	20,000.-	20,000.-	√	-	-	11 ต.ค.66	18 ต.ค.66	กองการศึกษาฯ	
	3.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	80,000.-	80,000.-	√	-	-	27 พ.ย. 66	27 พ.ย.66	กองการศึกษาฯ	
	4.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000.-	70,000.-	√	-	-	13 ม.ค.67	13 ม.ค.67	กองการศึกษาฯ	
	5.โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	80,000.-	53,900.-	√	-	-	19 ก.ค.67	19 ก.ค.67	กองการศึกษาฯ	
	6.โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่	50,000.-	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	7.โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000.-	-	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
	รวม 7 โครงการ	590,000.-	503,900.-							

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร

4.8 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
10	<u>แผนงานการเกษตร</u> 1.โครงการส่งเสริมการบำรุงดินแบบเกษตรอินทรีย์	10,000.-	9,450.-	√	-	-	17 ก.ย. 67	17 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
	2.โครงการส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน	15,000.-	5,050.-	√	-	-	16 ก.ค. 67	17 ก.ค. 67	สำนักปลัด	
	3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุนดาฯสยามบรมราชกุมารี อพ.สธ.(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น)	31,500.-	30,336.-	√	-	-	1 ต.ค. 66	30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
	รวม 3 โครงการ	56,500.-	44,836.-							

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	<u>แผนงานงบกลาง</u> 1.โครงการชุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7	11,000.-	11,000.-	√	-	-	12 ต.ค.66	18 ต.ค.66	กองช่าง	
	2.โครงการชุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6	19,000.-	19,000.-	√	-	-	12 ต.ค.66	18 ต.ค.66	กองช่าง	
	3.โครงการชุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3	30,000.-	30,000.-	√	-	-	22 ม.ค.67	16 ต.ค.67	กองช่าง	
	รวม 3 โครงการ	60,000.-	60,000.-							

เงินนอกงบประมาณ(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 10,055,000.- บาท

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
2	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 –เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น จากบ้านโคกสูง ถึงเขตบ้านสะเดาหวาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร	4,755,000.-	-	-	√	-	8 ส.ค. 67	6 ธ.ค. 67	กองช่าง ก่อหนี้ผูกพัน 3,309,900.-	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น สุดเขตบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โคกสูง อ.หนองกี่ เชื่อมบ้านหนองเต็ง ต.คลองเมือง อ จักราช ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,060 เมตร	5,300,000.-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
	รวม 2 โครงการ	10,055,000.-	-	-	-	-	-	-		

เงินนอกงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม) จำนวน 19 รายการ งบประมาณ 4,368,000.- บาท

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
2	<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> 1. โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน คูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนางถวิล จุดสิ้นสุด บ้านนางลำไย ขนาดผิวจราจรกว้าง เมตร ยาว 288 เมตร หน้า 0.15 เมตร คิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	360,000.-	-	-	√	-	9 ก.ย. 67	-	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน 342,500.-
	2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอ หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อของเดิมจากบ้าน นางจ้อย บุตรวงศ์) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสุภาพ นาคสระเกตุ จุดสิ้นสุด บ้านนางราตรี ปัญจะ ขัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หน้า 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	400,000.-	-	-	√	-	9 ก.ย. 67	-	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน 375,500.-

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น จากบริเวณสามแยกถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 4020 จุดสิ้นสุด ที่ดินนางสำเนียง ศรีจุมพลมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	430,000.-	-	-	√	-	9 ก.ย. 67	-	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน 410,000.-
	4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายประหยัด สอนไธสง จุดสิ้นสุด บ้านนายบรรจง สอนไธสง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	251,000.-	-	-	√	-	9 ก.ย. 67	-	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน 234,500.-

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อของเดิมจากสามแยกที่ดินนายพิชิต วงศา จันทร์) จุดเริ่มต้น ที่ดินนางนฤมล คำโฮง จุดสิ้นสุด ที่ดินนางสุพรรณิ โสตาพัฒน์ ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	400,000.-	-	-	√	-	8 ส.ค. 67	-	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน 399,500.-
	6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น บ้านนายสมศรี เทียมจันทร์ จุดสิ้นสุด ที่ดินนางกาเล ศรีหาบุญตัน ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	400,000.-	-	-	√	-	8 ส.ค. 67	-	กองช่าง	ก่อนนี้ ผูกพัน 399,500.-

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบล โคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ทิศใต้โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน จุดสิ้นสุด ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2166 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	194,000.-	-	-	√	-	9 ส.ค. 67	-	กองช่าง	ก่อนหน้านี้ ผูกพัน 193,500.-
	8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น จากบ้านหนองหว้า ทางทิศตะวันตกบริเวณบ้านนายไธ สิ้นสุพรรณ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายกองแก้ว บาลี ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	499,000.-	-	-	√	-	8 ส.ค. 67	-	กองช่าง	ก่อนหน้านี้ ผูกพัน 498,000.-

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบล โคกสูง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อของเดิมถนนคอนกรีตสายหน้าบ้าน นายธปกรณ์ กรั่มกระโทก) จุดเริ่มต้นที่ดินนางบุญมี ออโธสง จุดสิ้นสุด ที่ดินนางบุญมี ออโธสง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 790 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	499,000.-	-	-	√	-	8 ส.ค. 67	-	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน 498,000.-
	10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคันคลองอีสานเขียว บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อของเดิมถนนลาดยาง หมายเลข 4019) จุดเริ่มต้นที่ดินนายสุดที่ ประทุมพา จุดสิ้นสุด หนองมะเกลือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,155 เมตร หนา 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 924 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	200,000.-	199,500.-	√	-	-	20 ส.ค.67	26 ก.ย. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคันคลองอีสานเขียว บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อของเดิมจากใต้หนองใหญ่) จุดเริ่มต้น ที่ดินนางหนูเจน ปะวะเค จุดสิ้นสุด ที่ดินนายจำลอง ทศมาศ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร หิน 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 344 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	100,000.-	99,500.-	√	-	-	20 ส.ค.67	26 ก.ย. 67	กองช่าง	
	12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อของเดิมเชื่อมต่อจากถนน คสล. ที่ดินนางวิไล นารินทร์) จุดเริ่มต้น ศาลตาปู่หนองผือ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายบุญหนา แทนนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 415 เมตร หิน 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 415 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	110,000.-	99,500.-	√	-	-	20 ส.ค.67	26 ก.ย. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	13. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น จากทางแยกบ้านนางกฤษณา ชั้นเพชร จุดสิ้นสุด ที่ดินนายผัดบัวไซ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หิน 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 124 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	27,000.-	26,500.-	√	-	-	20 ส.ค.67	11 พ.ย. 67	กองช่าง	
	14. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อของเดิมจากถนนลาดยางวัดสะเดาหวาน) จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสุพิน วงสมบัติ จุดสิ้นสุด ที่ดินนายทา สิ้นสุพรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หิน 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 188 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	50,000.-	49,500.-	√	-	-	20 ส.ค.67	25 ก.ย. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงานที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้นดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ		
	15. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ที่ดินนายประสิทธิ์ พรหมมานอก จุดสิ้นสุด หนองไทร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	100,000.-	99,500.-	√	-	-	20 ส.ค.67	25 ก.ย. 67	กองช่าง	
	16. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคันคูคลองอีสานบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อของเดิมที่ดินนายดี พรหมน้ำ) จุดเริ่มต้น คันคูคลองทางทิศใต้บริเวณที่ดินนางสมศรี ทับบุญมี จุดสิ้นสุด ที่ดินนายพรพิสุทธิ์ ปลัดกอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	45,000.-	44,500.-	√	-	-	20 ส.ค.67	21 พ.ย. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	17. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคันคูคลอง อีสานเขียว บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบล โคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น คันคูคลองอีสานเขียวบริเวณที่ดิน นายสุทธา อินทร์นอก จุดสิ้นสุด หนองผือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 192 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย ปรับแต่ง	37,000.-	36,500.-	√	-	-	20 ส.ค.67	8 ก.ย. 67	กองช่าง	
	18. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคันคูคลอง อีสานเขียว บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 ตำบล โคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางหมายเลข 4019 จุดสิ้นสุด ที่ดินนายสุตใจ สอนไธสง ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 682.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยปรับแต่ง	130,000.-	129,500.-	√	-	-	20 ส.ค.67	2 ก.ย. 67	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่

1.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง

แผนงาน งาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ		
	19. โครงการถ่มร่อนน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 130 เมตร สูง 2.5 เมตร ปริมาตรดินถม 1,137.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 1 เมตร จำนวน 13 ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	136,000.-	136,000.-	√	-	-	5 ส.ค.67	23 ส.ค. 67	กองช่าง	
	รวม 19 โครงการ	4,368,000.-	921,000.-							

3.2 การประเมินผล

งานนโยบายและแผนได้จัดทำการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจำแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 ด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้แก่

- 1) ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
- 2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- 4) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม (ตามแบบ 3/2)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับ

- 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
- 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
- 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
- 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
- 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
- 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
- 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
- 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตามออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงการ / กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดการสุ่มตรวจเป็นรายไตรมาส เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล
2. ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในแต่ละเขตพื้นที่ได้ออกสำรวจความต้องการของประชาชนก่อนเพื่อนำเสนอแผนงาน / โครงการ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
3. ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ขอให้ระบุให้ชัดเจน เพราะอาจมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้างของโครงการนั้นๆ
4. กรณีเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปประสานงานให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ / กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
5. กรณีของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานนั้น ขอให้ระบุว่าโครงการอะไรอยู่ในขั้นตอนไหนบ้าง เพื่อที่จะทราบถึงระยะเวลาที่โครงการจะแล้วเสร็จ
6. ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา (30 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ)

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง <http://www.abtkoksung.go.th/> หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 65 หมู่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 หมายเลขโทรศัพท์ 044-666-733 ในวันและเวลาราชการ
